

Projeto M2 - Métodos Ágeis

Grupo: Matheus Bilitardo Abib

RGM: 11261401886

ANÁLISE DE MÉTRICAS DE FLUXO

Período do Projeto: 1 mês e 1 semana (aprox. 37 dias)

Gráfico Burndown (Sprints)

Sprint 1: Configuração inicial + API + Login

Histórias: US01, US02, US23

Pontos planejados: 8

Pontos entregues: 8

Tendência:  Normal

Sprint 2: Cadastro + Metas + Fagerström + Sintomas + Backend

Histórias: US03, US04, US06, US24

Pontos planejados: 13

Pontos entregues: 11 (US04 parcial)

Gargalo:  Integração do registro de sintomas com API → atraso de 2 dias

Sprint 3: Busca UPAs + Gráficos + Materiais + Tela Enfermeira (início)

Histórias: US05, US07, US08, US11

Pontos planejados: 10

Pontos entregues: 10

Tendência:  Normalizada após ajuste

Sprint 4: Matrícula + Presenças + Cronogramas + Tela Enfermeira (conclusão)

Histórias: US09, US10, US12, US13, US14, US15, US16

Pontos planejados: 14

Pontos entregues: 12 (US12 postergada para sprint 5)

Gargalo:  Complexidade da lógica de matrícula + verificação de conflitos

Sprint 5: Dashboard Admin + CRUD UPAs/Enfermeiras + Relatórios

Histórias: US17, US18, US19, US20, US21, US22, US25

Pontos planejados: 15

Pontos entregues: 13 (US22 postergada como débito técnico)

Tendência:  Entregue dentro do cronograma

Identificação de Gargalos

Sprint	Gargalo identificado	Causa	Solução aplicada
Sprint 2	Registro de sintomas	Dificuldade com serialização de dados no Flutter	Revisão do modelo de dados e adaptação do backend
Sprint 4	Lógica de matrícula	Verificação de matrícula ativa e conflitos de turma	Refatoração do controller no backend + testes manuais

Gráficos Burndown

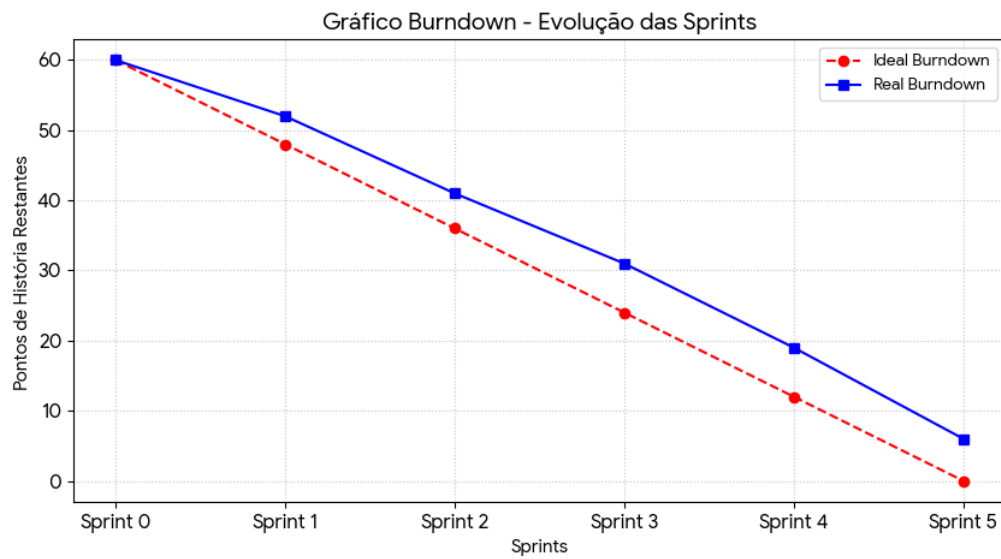


Gráfico CFD

